



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen

Erneuerung KAV-System

Stand der Arbeiten

10. MAGGLINGER RECHTSINFORMATIKSEMINAR

31. Mai 2010 – Michel Moret



Begrüßung

Kompetenzzentrum
Amtliche
Veröffentlichungen



KAV

Michel Moret
Bernard Moll
Heinz Mathys

Leiter KAV (seit 1. Juni 2008)
Stv. Leiter / Leiter Redaktion und Support
Leiter Planung und Produktion

Ein Team von 20 Personen um die Produktion BBL, AS und SR sicherzustellen



Produkte und Zahlen


- **Primärprodukte** Bundesblatt (BBI)
Amtliche Sammlung (AS)
 - **Sekundärprodukte** Systematische Rechtssammlung (SR)
→ 4528 Erlasse Online (Stand 17. Mai 2010)
 - **Derivate Produkte** Register, Inkrafttretenslisten, usw.
Separata, Sammelbroschüren, usw.
Abfragen, Statistiken, usw.
-

- **Print**
BBI, AS ca. 50'000 Seiten / Jahr
SR-Nachträge ca. 90'000 Seiten / Jahr
Abonnements ca. 10'000 Abos
 - **Online (Juli 2006)**
Abfragen 500'000 Besucher / Tag
SR 400'000 Besucher / Tag
75% admin.ch
Seiten 100 Seiten / Abfrage
Datenmenge 500 GB / Tag
 - Online (Nov. 2008)** BBI, AS, SR 31,4 Mio. Seitenanfragen
-

- **KAV-Anwender** ca. 1'500 in der Bundesverwaltung



Gesetzgebungsprozess und das KAV - 1

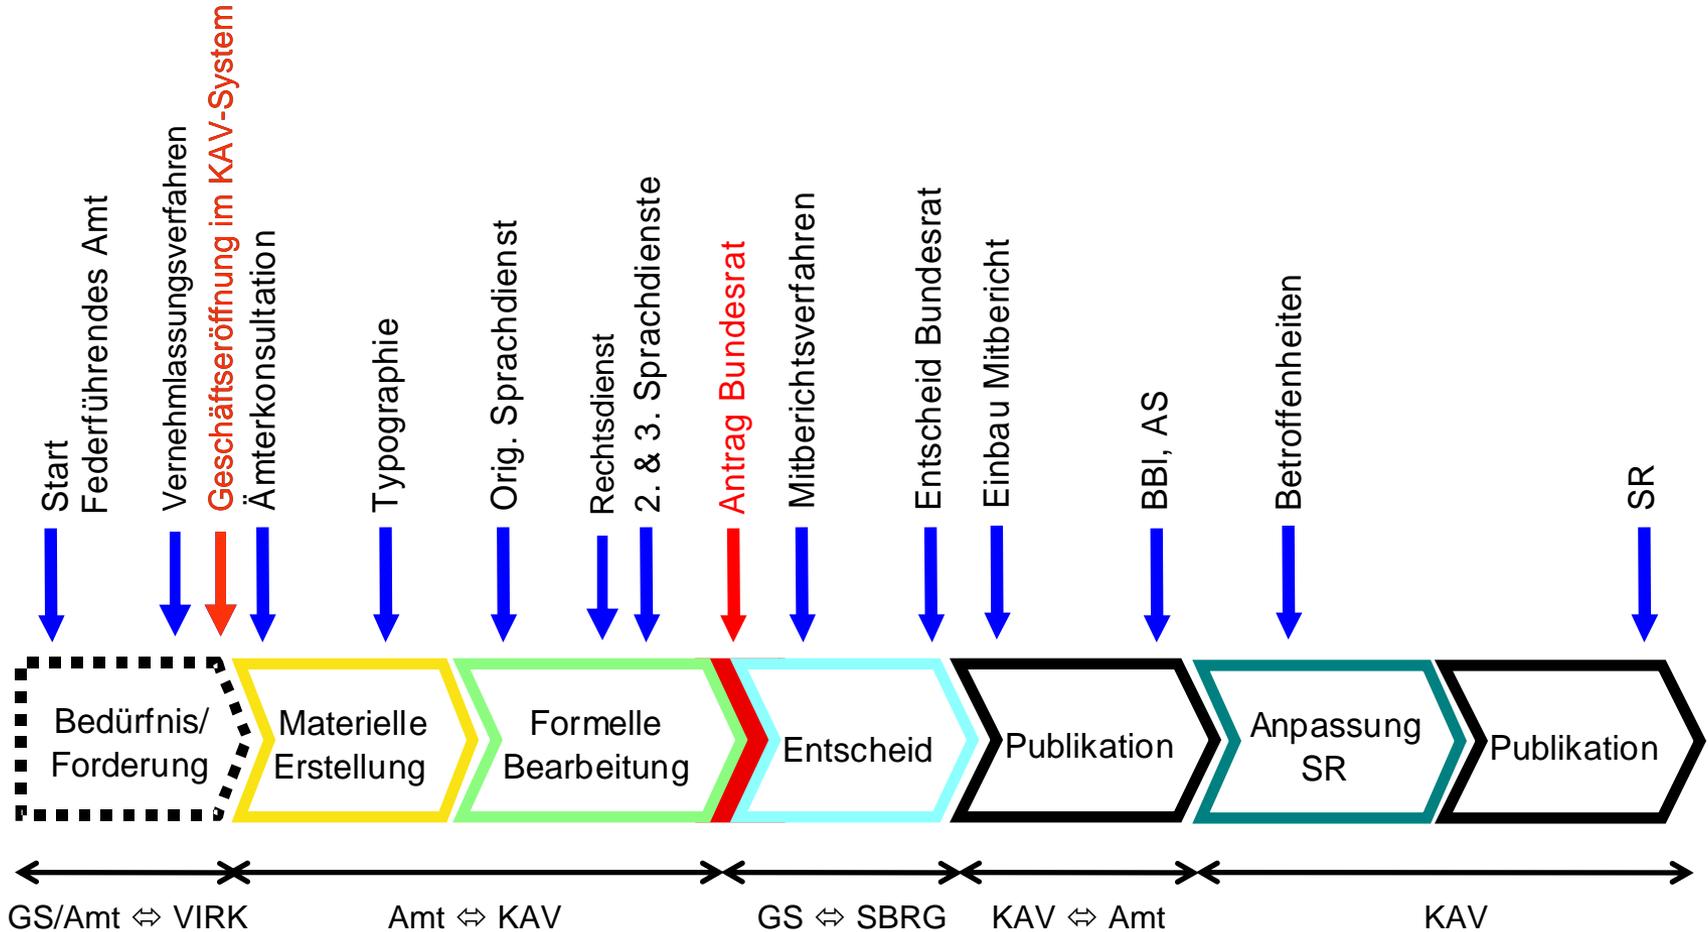



Projekt “KAV-Erneuerung”

- Beendigung der Zusammenarbeit zwischen den Bundeskanzlei und dem externen Technologie-Anbieter
 - *Ende 2009 brachte die Evaluation des Projektverlaufs bei beiden Parteien unterschiedliche Auffassungen über die Projektschwerpunkte und die Modalitäten der Auftragsabwicklung zutage.*
 - *Die Parteien haben sich deshalb für die vertragliche Projektbeendigung entschieden. Gestützt darauf wurde am 10. Februar 2010 ein Aufhebungsvertrag vereinbart.*
 - *Das Projekt war im Jahr 2007 gestartet worden, weil das bisherige System technologisch veraltet ist und sich dem Ende seiner Lebensdauer nähert.*
 - *Die Zusammenarbeit mit dem externen Technologie-Anbieter hatte im März 2008 begonnen.*
 - *Der Prozess der Amtlichen Veröffentlichungen ist weiterhin sicher gestellt.*



Wie weiter? - 1

- **Bis Ende März 2010 wurden**
 - der Verlauf der beendeten Projektarbeit analysiert,
 - die Lehre aus dem Projektverlauf gezogen,
 - die letzten notwendigen Projektarbeiten für einen korrekten Abschluss des Projektes erledigt.

- **Bis Ende August 2010 werden**
 - die Erneuerung des bestehenden KAV-Systems neu angedacht und mögliche Synergien mit anderen laufenden und geplanten Vorhaben evaluiert
 - *wie z.B. das Programm [GEVER Bund](#)*
 - *oder der Vorhaben „[A2.08 Zugang zu Rechtsdaten](#)“ der E-Government Strategie Schweiz*
 - ein konkreter Vorschlag für das weiteres Vorgehen der Geschäftsleitung der Bundeskanzlei zum Entscheid vorgelegt
 - *inklusive einer Grobanalyse der Tendenzen und Lösungen auf nationaler und internationaler Ebene*



Wie weiter? - 2

- Die ursprünglichen Ziele des Projektes bleiben grundsätzlich aktuell
 - **Texterfassungsmöglichkeiten verbessern**
 - *einfache und effiziente Textbearbeitung, flexible Textvorlagen und Bausteine*
 - **Produktionsablauf optimal technisch steuern**
 - *flexible Geschäftsabwicklung mit integrierter Planung, rationelle Produktion von Publikationen, Harmonisierung der Referenzen (d, f, i) des Bundesblattes, medienneutrale Datenhaltung*
 - **Internetangebot für die Öffentlichkeit erweitern**
 - *(Seh-)behindertengerechte Aufbereitung, Bedienung neuer Medien (Mobile), datumsspezifische Fassungen der SR in ihren jeweiligen Zeitzusammenhang, zusätzliche und zuverlässigere Links auf externe Dokumente, Abonmierbare Benachrichtigung zu Gesetzesänderungen*
 - **Modernisierung der Technologie sowie Vereinfachung der Schnittstellen**




Wie weiter? - 3

- Folgende Möglichkeiten werden besonders geprüft:
 - **Technische Voraussetzungen für allfällige Rechtsverbindlichkeit elektronischer Fassungen**
 - **Etappierung der Realisierung auf mehrere Jahren**
 - **Zusammenhängende Module anstatt Gesamtsystem**
 - **Bestgeeignete Lösung pro Modul**
 - **Bundeskanzlei übernimmt selbst die Rolle GU**



Wie weiter? - 4

- Die Hauptkomponenten eines erneuerten KAV-System bleiben auch grundsätzlich aktuell

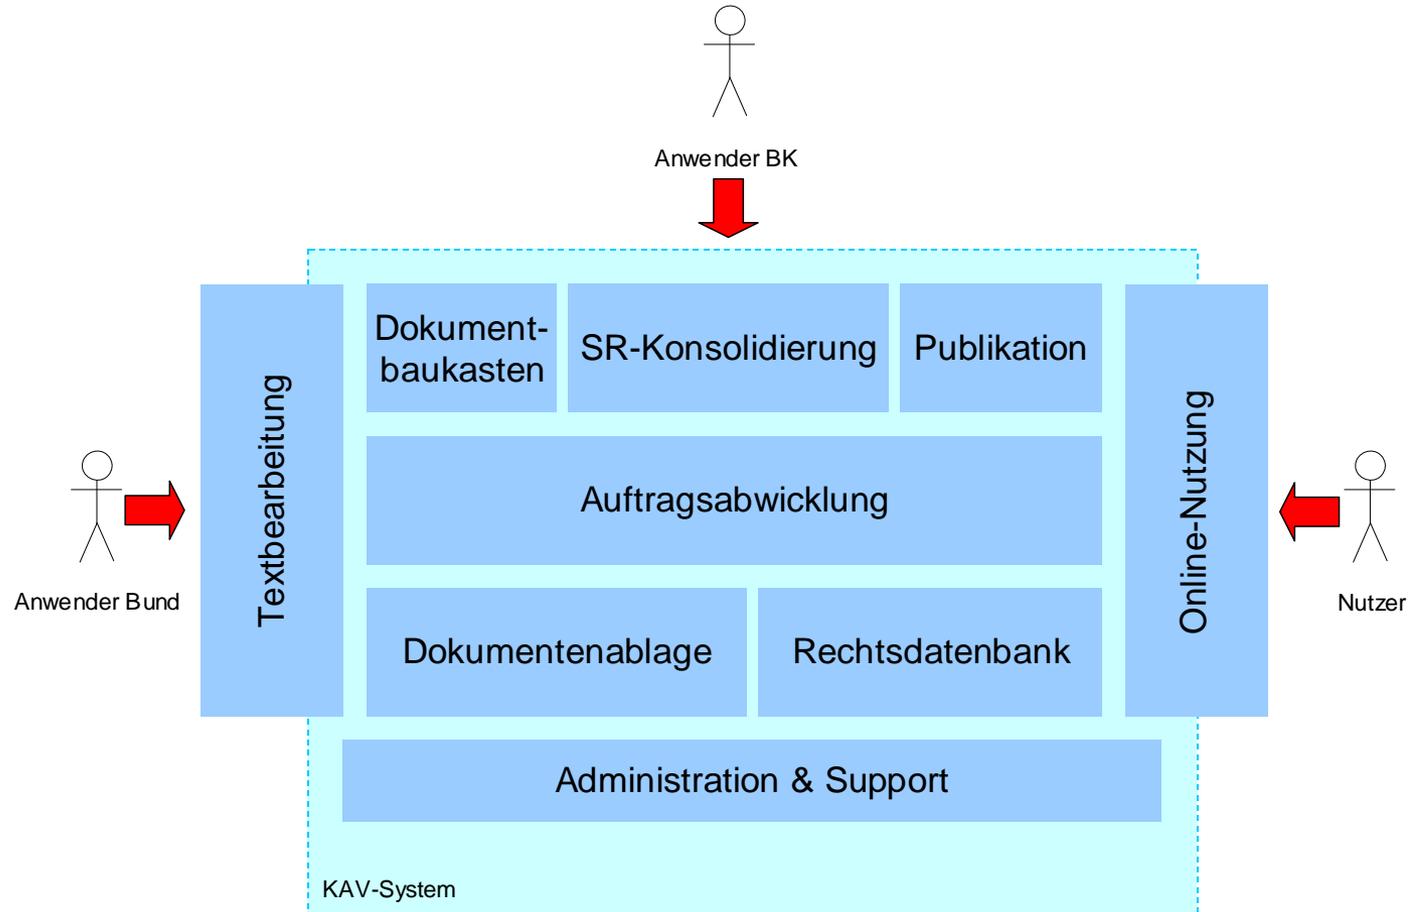



Fragen



Rendez-vous spätestens in Magglingen 2011, um mehr
über die Erneuerung des KAV-Systems zu erfahren

*mit der Hoffnung, dass
erfreulichere Informationen und Resultate
zur Verfügung stehen werden*
